

Alertas de Obras Públicas Paralizadas en el Perú

Resultados a julio del 2026

Carlos Vargas, Joaquin Rivadeneyra, Jorge Manrique y Naimid Vargas | Julio de 2026

Acerca del equipo



Carlos Vargas Mas

Director del Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas Subnacionales en el Perú, iniciativa de la Cooperación Económica Suiza e implementado por el Basel Institute on Governance. Cuenta con experiencia en gestión pública, control gubernamental y políticas públicas, habiendo trabajado en la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Applied Economic Analysis por la Universidad Pompeu Fabra.

Correo electrónico: carlos.vargas@baselgovernance.org



Joaquin Rivadeneyra Bustamante

Investigador - Programa GFP Subnacional

Se desempeña como consultor en el Basel Institute on Governance, donde realiza investigación y análisis económico para el Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas Subnacionales. Cuenta con experiencia en investigación académica en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Piura, y ha trabajado antes en el Ministerio de Cultura del Perú.

Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a magíster en la misma universidad.

Correo electrónico: joaquin.rivadeneyra@gfpsubnacional.pe



Jorge Manrique Vela

Investigador - Programa GFP Subnacional

Se desempeña como consultor en el Basel Institute on Governance, donde realiza análisis técnico vinculado a la gestión de obras públicas y finanzas verdes en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas Subnacionales.

Cuenta con experiencia en el seguimiento y análisis de obras públicas, así como en el uso de herramientas geoespaciales aplicadas al control gubernamental y ambiental en la Contraloría General de la República.

Es administrador de empresas por la Universidad San Ignacio de Loyola y candidato a magíster en la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Correo electrónico: jorge.manrique@gfpsubnacional.pe



Naimid Vargas Bardales

Asistente de investigación - Programa GFP Subnacional

Se desempeña como practicante de investigación en el Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas Subnacionales, implementado por Basel Institute on Governance.

Cuenta con experiencia en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desempeñó como practicante de investigación.

Economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Correo electrónico: vargasb.n@pucp.edu.pe

Acerca del Programa **GFP Subnacional**

Suiza, a través de su **Cooperación Económica**, impulsa el **Programa GFP Subnacional**, que busca mejorar la Gestión de las Finanzas Públicas (GFP) en los trece (13) Gobiernos Subnacionales (GSN) donde interviene, a través del fortalecimiento de las capacidades de los GSN para cumplir de manera eficiente, efectiva y transparentemente con sus crecientes obligaciones en el manejo de los recursos públicos, bajo el proceso de descentralización en curso.

El **Programa GFP Subnacional** es implementado por el **Basel Institute on Governance**.



Escanea el QR
para visitar la página web

Gobiernos beneficiarios del Programa

Los beneficiarios del programa son los Gobiernos Regionales de Apurímac, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura y San Martín y los Gobiernos Municipales de las provincias de Abancay, Cusco, Maynas, Piura, San Martín y Trujillo.

Síguenos en:

Facebook: www.facebook.com/GFPsubnacional/
X: [@Programa_GFP](https://twitter.com/Programa_GFP)
LinkedIn: www.linkedin.com/company/programa-gfp-subnacional
Youtube: www.youtube.com/@GFPsubnacional
Web: www.gfpsubnacional.pe

Resumen

Las obras públicas paralizadas representan una de las expresiones más visibles de ineficiencia en la inversión pública, pues implican recursos inmovilizados, infraestructura inconclusa, servicios públicos que no llegan oportunamente a la ciudadanía, costos de reactivación y pérdida de confianza en la capacidad del Estado para cerrar brechas.

A julio de 2026, el Perú registra 1,061 obras públicas paralizadas o en riesgo de paralización, con un saldo de inversión pendiente de ejecución de S/ 9,818 millones. Estas cifras evidencian un problema relevante para la gestión de la inversión pública, debido a que reflejan recursos comprometidos que aún no se traducen en infraestructura culminada ni en servicios plenamente disponibles para la población.

Los resultados muestran que la paralización de obras públicas no solo debe entenderse por la cantidad de obras afectadas, sino también por su magnitud financiera y concentración territorial. Los Gobiernos Locales concentran la mayor cantidad de obras paralizadas, mientras que el Gobierno Nacional concentra el mayor saldo pendiente de ejecución, asociado principalmente a proyectos de mayor escala.

Asimismo, se observa que una parte importante de las obras mantiene periodos prolongados de inactividad física y financiera. Esta situación evidencia dificultades persistentes de continuidad, priorización y reactivación dentro de la cartera de inversiones públicas.

En conjunto, el reporte muestra que la paralización de obras públicas continúa siendo un problema estructural para la inversión pública en el Perú, con impactos fiscales, institucionales y sociales significativos.

Los autores agradecen el valioso aporte de Eduardo Padilla Carhuaz, Constante Castillo Alva, Nelson Báez Pacheco, Julio César Morales Palacios, Diana Castro Litano, Carla Berrios Delgado y Santos Elva Cruz Gálvez, consultores del Programa GFP Subnacional, cuya experiencia y contribuciones enriquecieron el presente estudio.

Índice

Resumen	4
I. Introducción	6
II. Resultados a julio del 2026	7
1. Cantidad total y distribución general	8
2. Distribución por nivel de gobierno	9
3. Distribución por rango de inversión	9
4. Inclusión en el PMI	11
5. Distribución sectorial por nivel de gobierno	11
6. Avance físico y avance financiero	14
7. Modalidad de ejecución	16
8. Causales de paralización	17
9. Tiempo de paralización e inactividad	18
10. Distribución regional y municipal	20
III. Conclusiones	22
IV. Referencias	24
V. Anexos	25
1. Anexo A: Diccionario mínimo de variables	25
2. Anexo B: Obras paralizadas pertenecientes a un mismo proyecto de inversión . .	26
3. Anexo C: Obras excluidas del informe	38

I. Introducción

La paralización de obras públicas constituye un problema recurrente en la ejecución de la inversión pública peruana. Una obra paralizada no solo implica recursos inmovilizados, sino también infraestructura inconclusa, deterioro de activos, mayores costos de reactivación y pérdida de bienestar para la población beneficiaria.

En sectores como transporte, saneamiento, salud, educación, agricultura e infraestructura pública, la paralización puede retrasar el acceso a servicios esenciales o reducir la calidad de los servicios existentes. Por ello, conocer el estado actual de las obras paralizadas permite dimensionar el impacto fiscal, territorial e institucional de este problema.

A julio de 2026, el país registra 1,061 obras públicas paralizadas o en riesgo de paralización, con un saldo de inversión pendiente de ejecución de S/ 9,818 millones. Estos resultados muestran que la paralización no se limita a proyectos en etapas iniciales, sino que también afecta a obras con avances físicos importantes e incluso cercanas a su culminación.

El presente reporte expone los principales resultados sobre las obras públicas paralizadas en el Perú a julio de 2026. El análisis se organiza en torno a su distribución territorial, nivel de gobierno, rango de inversión, inclusión en el Programa Multianual de Inversiones, sectores involucrados, avance físico y financiero, modalidad de ejecución, causales de paralización, tiempo de inactividad y concentración regional y municipal.

De esta manera, el documento ofrece una lectura general del estado de las obras públicas paralizadas en el país, destacando la magnitud del problema, sus principales patrones de concentración y sus implicancias para la gestión de la inversión pública.

II

Resultados a julio del 2026

1. Cantidad total y distribución general

A julio de 2026, se han identificado **1,061 obras públicas paralizadas** (o en riesgo de paralización), con un **saldo de inversión por ejecutar de S/ 9,818 millones**. Este monto representa recursos comprometidos que aún no se traducen en infraestructura culminada ni en servicios plenamente disponibles para la población.

Cuadro 1: Distribución departamental de obras paralizadas según cantidad y saldo de inversión

Departamento	Obras paralizadas	%Obras	Saldo paralizado (S/.)	%Saldo
Lima	106	9.99%	1,397,158,568	14.23%
La Libertad	51	4.81%	1,286,449,123	13.10%
Ancash	90	8.48%	1,169,069,454	11.91%
Piura	73	6.88%	1,042,631,323	10.62%
Ica	8	0.75%	703,069,814	7.16%
Arequipa	71	6.69%	668,033,338	6.80%
Cajamarca	56	5.28%	666,582,183	6.79%
Tacna	15	1.41%	508,195,822	5.18%
Puno	126	11.88%	323,452,669	3.29%
Junin	32	3.02%	296,010,845	3.01%
Cusco	124	11.69%	286,068,961	2.91%
Ayacucho	76	7.16%	252,575,081	2.57%
Apurimac	48	4.52%	230,932,578	2.35%
Huancavelica	23	2.17%	195,554,931	1.99%
Madre de Dios	15	1.41%	152,703,694	1.56%
Lambayeque	34	3.20%	141,827,023	1.44%
Huanuco	27	2.54%	131,651,542	1.34%
Amazonas	18	1.70%	130,837,334	1.33%
Moquegua	18	1.70%	69,405,648	0.71%
San Martin	9	0.85%	44,598,704	0.45%
Pasco	12	1.13%	37,996,650	0.39%
Loreto	12	1.13%	34,155,600	0.35%
Tumbes	4	0.38%	26,001,976	0.26%
Ucayali	12	1.13%	23,248,532	0.24%
Callao	1	0.09%	105,575	0.00%
Total	1,061	100.00%	9,818,316,967	100.00%

Nota: El saldo de inversion corresponde a la diferencia entre costo actualizado y devengado acumulado. El % de obras se calcula sobre el total de obras paralizadas. Cifras en soles (S/.)

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

La distribución territorial muestra que Puno concentra el mayor número de obras paralizadas, con 126 casos, seguido por Cusco con 124, Lima con 106 y Áncash con 90. Sin embargo, la mayor concentración del saldo pendiente no se encuentra necesariamente en los departamentos con más obras: Lima concentra el 14.23 % del saldo por ejecutar, debido al

peso de proyectos de gran escala.

Figura 1: Dispersión departamental: porcentaje de obras paralizadas y porcentaje de saldo por ejecutar



*Nota: Los porcentajes se calculan sobre el total nacional. El tamaño de cada burbuja representa el saldo de inversión por ejecutar en soles.
Fuente: INFOBRAS V2 - Consulta Avanzada MEF. Elaboración propia.*

2. Distribución por nivel de gobierno

Por nivel de gobierno, la mayor cantidad de obras paralizadas corresponde a los Gobiernos Locales, con 724 obras, equivalentes al 68.24 % del total. No obstante, el mayor saldo de inversión por ejecutar se concentra en el Gobierno Nacional, que representa el 56.03 % del saldo total, pese a concentrar solo el 20.08 % de las obras.

Cuadro 2: Distribución de obras paralizadas por nivel de gobierno

Nivel de gobierno	Obras paralizadas	%Obras	Saldo paralizado (S/.)	%Saldo
Gobierno Nacional	213	20.08%	5,500,931,670	56.03%
Gobierno Regional	124	11.69%	2,282,338,398	23.25%
Gobierno Local	724	68.24%	2,035,046,900	20.73%
Total	1,061	100.00%	9,818,316,967	100.00%

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

Este patrón sugiere una diferencia relevante entre cantidad y magnitud fiscal: los Gobiernos Locales concentran más casos, pero el Gobierno Nacional concentra obras de mayor escala presupuestal.

3. Distribución por rango de inversión

La mayoría de obras paralizadas se ubica en rangos de inversión menores o intermedios. En particular, 212 obras tienen un costo actualizado menor o igual a S/ 0.5 millones, mientras que

469 obras se ubican entre S/ 1 millón y S/ 10 millones. Sin embargo, también se identifican obras de muy alto costo, 70 intervenciones superiores a S/ 50 millones.

Cuadro 3: Distribución de obras paralizadas por rango de costo actualizado y nivel de gobierno

Rango de inversion	Gobierno Regional	Gobierno Local	Gobierno Nacional	Total general
<= 0.5 millones	2	198	12	212
> 0.5 - 1 millón	1	125	7	133
> 1 - 3 millones	17	152	25	194
> 3 - 5 millones	17	77	22	116
> 5 - 10 millones	30	68	60	158
> 10 - 20 millones	21	52	29	102
> 20 - 50 millones	18	33	25	76
> 50 millones	18	19	33	70
Total	124	724	213	1,061

Nota: El rango de inversion se calcula sobre el costo actualizado de la inversion. Dentro del mayor rango de inversion se observa la paralización de la i) construcción y mantenimiento de las obras de afianzamiento hidrico del proyecto Majes Siguan II etapa en Arequipa; ii) la instalación del establecimiento penitenciario en Ica; y iii) el servicio de protección contra inundaciones río Chicama - Tramo 02

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

Las obras con mayores saldos pendientes de inversión no necesariamente coinciden con aquellas que presentan los mayores montos de expediente técnico. En particular, destaca la obra del **Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica**, cuyo monto de expediente técnico asciende a S/ 383.71 millones, mientras que su saldo pendiente de inversión alcanza los S/ 641.92 millones. Asimismo, resalta el **Tramo Santiago de Chuco-Cachicadan-Mollepata**, con un monto de expediente técnico de S/ 359.77 millones y un saldo pendiente de inversión de S/ 365.35 millones. Esta diferencia se explica porque la obra forma parte de un proyecto de inversión (**Carretera Pallasca-Mollepata**) de, cuyo costo total supera ampliamente los S/ 1000 millones.

Cuadro 4: Las 10 obras paralizadas de mayor saldo de inversión

Nombre de la obra	Entidad ejecutora	Avance físico (%)	Avance financiero (%)	Saldo paralizado (S/.) (millones S/.)
Nuevo establecimiento penitenciario de Ica	Ministerio de Justicia	27.68%	26.83%	641.92
Tramo Santiago de Chuco-Cachicadan-Mollepata. Carretera Pallasca-Mollepata	PROVIAS Nacional	30.60%	51.89%	365.35
Tramo Mollepata-Pallasca. Carretera Pallasca-Mollepata	PROVIAS Nacional	30.60%	51.89%	365.35
Hospital Hipólito Unanue de Tacna: Componente 1 y 2	GORE Tacna	39.75%	45.15%	347.49
Carretera CA-103 de Cajamarca	GORE Cajamarca	5.14%	21.36%	277.48
Carretera Huancabamba. Tramo KM. 71600	PROVIAS Nacional	32.35%	55.37%	256.75
Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki de Junín	GORE Junín	0.00%	16.99%	222.53
Mejoramiento de la Carretera (PU-135) Checca - Mazocruz	PROVIAS Nacional	45.96%	52.86%	213.53
Servicio de protección del río Huaura. Paquete 05	Autoridad Nacional de Infraestructura	10.89%	67.20%	208.43
Infraestructura vial del Paquete 5R en Áncash. Tramo 1 y 2	PROVIAS Descentralizado	32.94%	26.78%	208.28

Nota: Top 10 obras por saldo paralizado. Montos en millones de soles.

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

4. Inclusión en el PMI

De las 1,061 obras paralizadas identificadas, 381 se encuentran incluidas en el PMI vigente, mientras que 680 no lo están. Esta diferencia es relevante porque la inclusión en el PMI puede reflejar una mayor posibilidad de programación, priorización o seguimiento dentro del ciclo de inversión pública.

Cuadro 5: Obras paralizadas incluidas en el PMI por nivel de gobierno

Incluido en PMI	Gobierno Regional	Gobierno Local	Gobierno Nacional	Total general
NO	52	517	111	680
SI	72	207	102	381
Total	124	724	213	1,061

Nota: Identifica la condición de inclusión en el Programa Multianual de inversiones del año vigente.

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

5. Distribución sectorial por nivel de gobierno

En el Gobierno Nacional, el mayor número de obras paralizadas se concentra en Transportes y Comunicaciones, con 58 obras, seguido por la Vivienda, Construcción y Saneamiento, con 43 obras. De la misma forma, el mayor saldo pendiente se concentra el sector de Transportes y Comunicaciones (39.29 %), asociada a proyectos de gran escala.

Cuadro 6: Distribución de obras paralizadas del Gobierno Nacional por sector

Sector	Nro Obras	Saldo Paralizado (S/.)	%Obras	%Saldo
Transportes y Comunicaciones	58	2,161,404,168	27.23%	39.29%
Presidencia Consejo Ministros	8	1,101,171,680	3.76%	20.02%
Vivienda, Construcción y Saneamiento	43	798,785,084	20.19%	14.52%
Justicia	1	641,924,032	0.47%	11.67%
Energía y Minas	23	191,414,281	10.80%	3.48%
Educación	36	186,758,968	16.90%	3.40%
Salud	4	140,227,540	1.88%	2.55%
Agricultura	25	133,747,468	11.74%	2.43%
Orden Público/Defensa y Seguridad	3	73,606,518	1.41%	1.34%
Interior	1	19,554,462	0.47%	0.36%
Otros Sectores	3	16,340,546	1.41%	0.30%
Poder Judicial	1	14,026,079	0.47%	0.25%
Fonafe	3	10,324,647	1.41%	0.19%
Producción	1	6,108,233	0.47%	0.11%
Cultura	2	3,348,284	0.94%	0.06%
Comercio Exterior y Turismo	1	2,189,680	0.47%	0.04%
TOTAL	213	5,500,931,670	100.00%	100.00%

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

En los Gobiernos Regionales, las obras paralizadas se concentran principalmente en Transportes y Comunicaciones, Agricultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Educación. No obstante, el sector Salud concentra el mayor saldo por ejecutar, con 32.22 % del total regional.

Cuadro 7: Distribución de obras paralizadas del Gobierno Regional por tipo de obra

Tipo de Obra	Nro Obras	%Obras	Saldo Paralizado (S/.)	%Saldo
Salud	8	6.45%	S/. 735,356,452	32.22%
Transportes y Comunicaciones	36	29.03%	S/. 707,208,913	30.99%
Otras Infraestructuras	15	12.10%	S/. 393,139,435	17.23%
Educación	17	13.71%	S/. 190,645,345	8.35%
Vivienda, Construcción y Saneamiento	22	17.74%	S/. 133,215,937	5.84%
Agricultura	23	18.55%	S/. 121,536,237	5.33%
Cultura	1	0.81%	S/. 656,774	0.03%
Energía y Minas	2	1.61%	S/. 579,306	0.03%
TOTAL	124	100.00%	S/. 2,282,338,398	100.00%

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

En los Gobiernos Locales, las obras paralizadas se concentran en Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Otras Infraestructuras y Educación. En términos de saldo pendiente, destacan Vivienda, Construcción y Saneamiento (42.71 %).

Cuadro 8: Distribución de obras paralizadas del Gobierno Local por tipo de obra

Tipo de Obra	Nro Obras	%Obras	Saldo Paralizado (S/.)	%Saldo
Vivienda, Construcción y Saneamiento	164	22.65%	S/. 869,232,444	42.71%
Transportes y Comunicaciones	227	31.35%	S/. 535,668,577	26.32%
Otras Infraestructuras	136	18.78%	S/. 195,257,016	9.59%
Agricultura	69	9.53%	S/. 190,979,829	9.38%
Educación	89	12.29%	S/. 118,218,188	5.81%
Salud	9	1.24%	S/. 88,165,870	4.33%
Orden Público/Defensa y Seguridad	10	1.38%	S/. 23,997,736	1.18%
Cultura	7	0.97%	S/. 10,772,847	0.53%
Energía y Minas	8	1.10%	S/. 1,708,118	0.08%
Protección/Readaptación Social	5	0.69%	S/. 1,046,276	0.05%
TOTAL	724	100.00%	S/. 2,035,046,900	100.00%

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

6. Avance físico y avance financiero

Las obras paralizadas no se concentran únicamente en etapas iniciales. La distribución por rango de avance físico muestra casos en todos los tramos, incluso en rangos superiores al 80 %. Esto confirma que la paralización puede ocurrir tanto en fases tempranas como en etapas avanzadas de ejecución.

Cuadro 9: Distribución de obras paralizadas por rango de avance físico y nivel de gobierno


Rango de avance físico	Gobierno Regional	Gobierno Local	Gobierno Nacional	Total general
0 - 10 %	14	75	47	136
10 - 20 %	12	68	16	96
20 - 30 %	7	74	20	101
30 - 40 %	9	77	27	113
40 - 50 %	10	91	16	117
50 - 60 %	18	93	12	123
60 - 70 %	10	85	29	124
70 - 80 %	15	63	10	88
80 - 90 %	21	64	28	113
90 - 95 %	8	34	8	50
Total	124	724	213	1,061

Nota: El rango de avance físico se calcula sobre el avance registrado en INFOBRAS y/o del SSI Formato 12-B.

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

La relación entre avance físico y financiero presenta una dispersión considerable. Esto evidencia posibles desbalances entre el progreso físico reportado y la ejecución financiera acumulada. En algunos casos, se observan obras con alto avance financiero y menor avance físico, mientras que en otros ocurre lo contrario.

Figura 2: Dispersión de obras paralizadas según avance físico y financiero

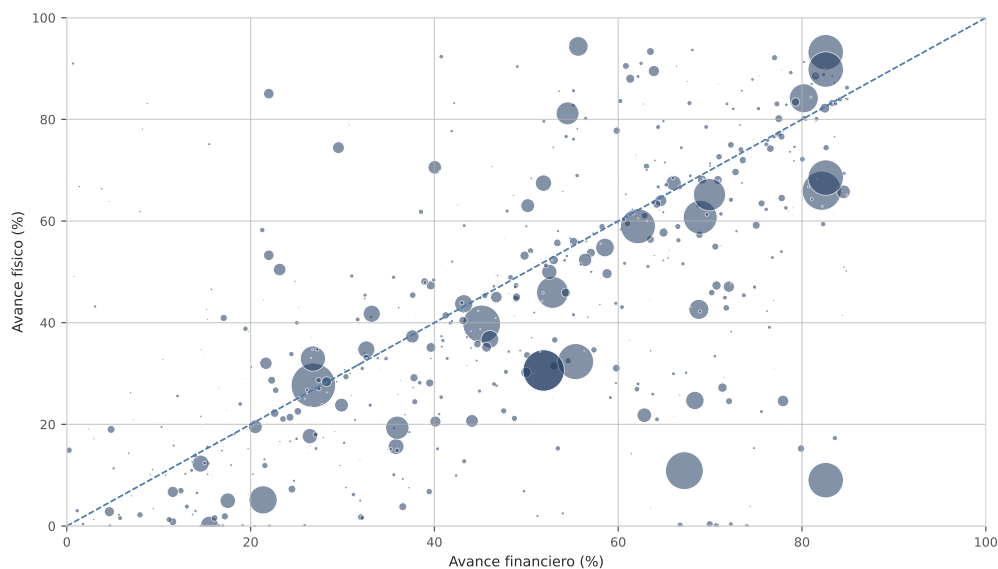


Nota: Se observa una dispersión significativa entre el avance físico y financiero de las obras paralizadas, lo que sugiere inconsistencias en la ejecución presupuestal respecto al progreso real de las inversiones.

Fuente: INFOBRAS V2, Banco de Inversiones MEF, CGR 2025

Al desagregar por nivel de gobierno, se mantiene la heterogeneidad físico-financiera. Esto refuerza la necesidad de analizar las obras paralizadas combinando evidencia física, financiera y administrativa, y no solo a partir de una variable aislada.

Figura 3: Relación entre avance físico y financiero por nivel de gobierno

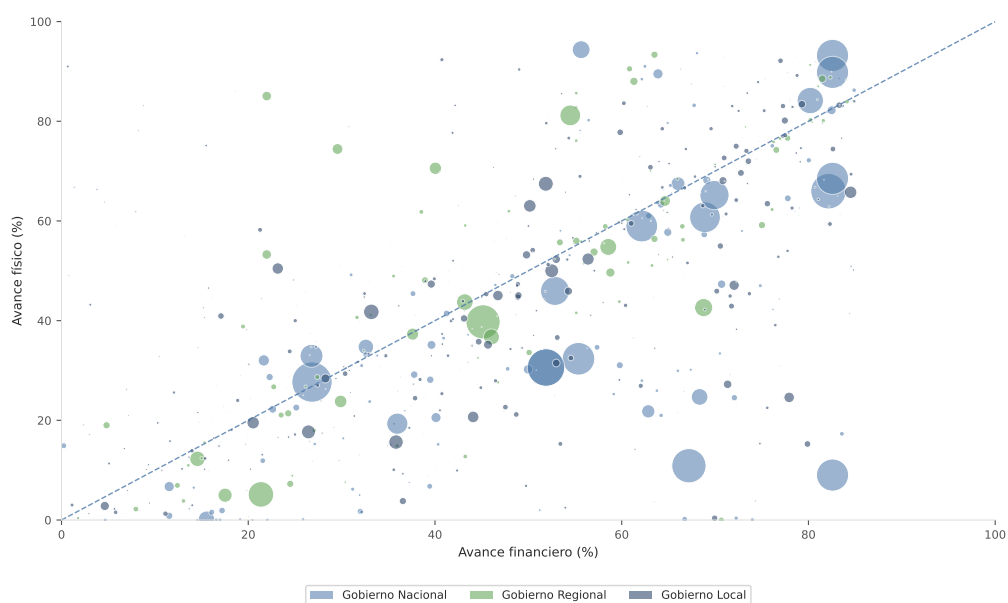

Fuente: INFOBRAS V2 · Consulta Avanzada MEF

7. Modalidad de ejecución


La mayor parte de obras paralizadas corresponde a la modalidad Contrata, con 565 obras, seguida por Administración Directa, con 465 obras. La distribución varía por nivel de gobierno: en los Gobiernos Locales predomina la Administración Directa, mientras que en el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales predomina la Contrata.

Cuadro 10: Distribución de obras paralizadas por modalidad de ejecución y nivel de gobierno

Modalidad de ejecución	Gobierno Regional	Gobierno Local	Gobierno Nacional	Total general
Contrata	105	281	179	565
Administración directa	19	439	7	465
Por núcleo ejecutor	0	0	19	19
Obras por impuestos	0	4	0	4
Por convenio entre entidades	0	0	0	0
Gobierno a Gobierno	0	0	8	8
Total	124	724	213	1,061

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

Figura 4: Frecuencia de obras paralizadas por nivel de gobierno, rango de avance físico y modalidad de ejecución

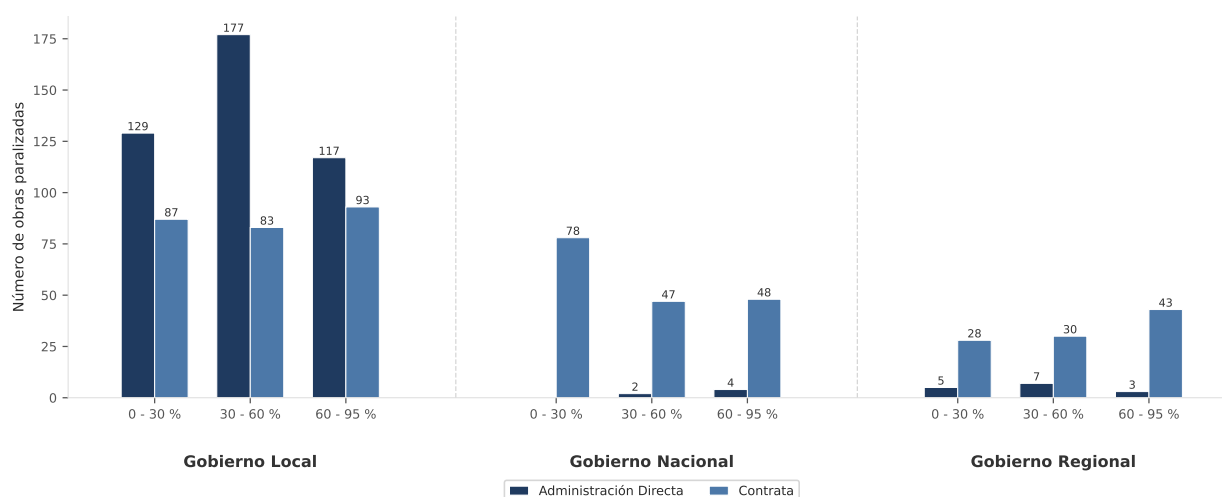

Nota: Avance físico reportado en INFOBRAS

Fuente: INFOBRAS V2 · Consulta Avanzada MEF

8. Causales de paralización

Las principales causales identificadas son Incumplimiento de contrato con 279 obras; seguido por Falta de recursos financieros y liquidez, con 240 obras; Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros, con 80 obras; e Discrepancias, controversias y arbitraje, con 77 obras.


Cuadro 11: Obras paralizadas según causal de paralización

Causal de paralización	Nro de obras
Incumplimiento de contrato	279
Falta de recursos financieros y liquidez	240
Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros	80
Discrepancias, controversias y arbitraje	77
Deficiencia en el expediente técnico	76
Conflictos sociales	38
Abandono de obra	34
Eventos climáticos	25
Disponibilidad de terreno	17
Desabastecimiento sostenido de materiales	13
Falta de permisos, licencias y autorizaciones	9
Interferencias	5
Obra judicializada por la entidad	4
Falta de personal clave	3
Nulidad de oficio del contrato	1
Otros	160
Total	1,061

Nota: Causales registradas en INFOBRAS V2 y/o validadas con SSI Formato 12-B.


Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

La distribución por nivel de gobierno muestra que las causales no tienen el mismo peso institucional. En los Gobiernos Locales se concentra la mayor cantidad absoluta de paralizaciones, mientras que en el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales algunas causales específicas pueden estar asociadas a proyectos de mayor escala o complejidad.

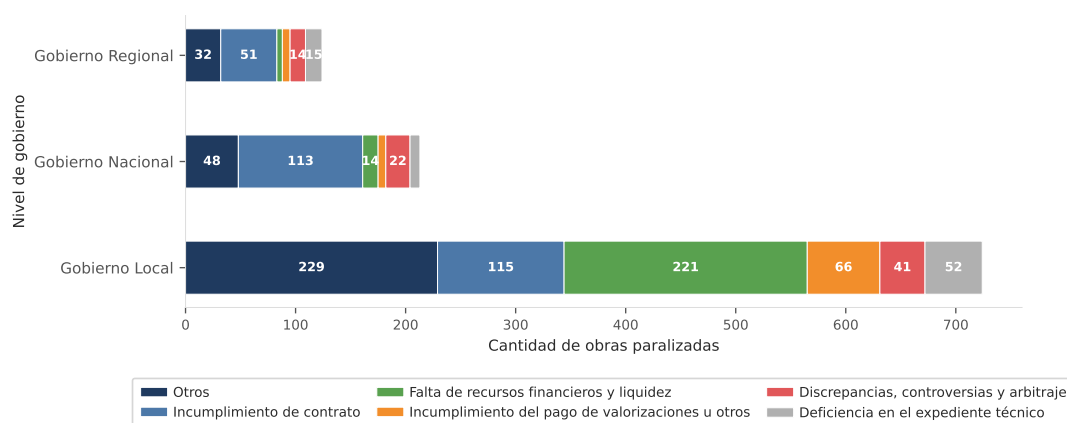Figura 5: Frecuencia de obras paralizadas por nivel de gobierno y causal de paralización

9. Tiempo de paralización e inactividad


El análisis temporal muestra que una parte importante de las obras presenta periodos prolongados de paralización. La mayor concentración se ubica entre 2 y 4 años de paralización, especialmente en Gobiernos Locales. Aquí se define tiempo de paralización como tiempo transcurrido desde el último avance físico reportado hasta la fecha de corte del informe.

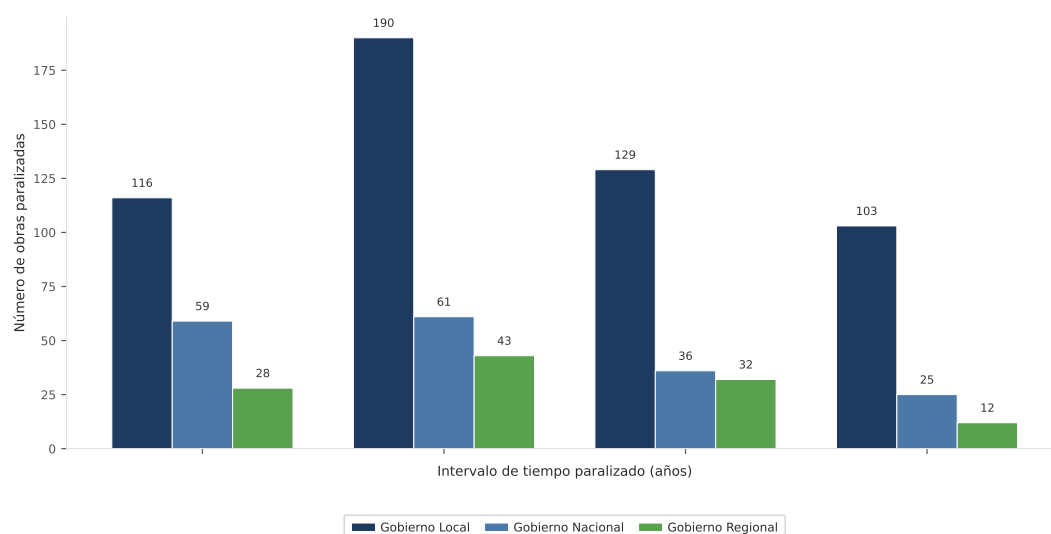Figura 6: Tiempo de paralización de obras públicas

La evolución anual de la fecha de paralización evidencia que el universo actual de obras

paralizadas acumula casos originados en distintos años. Esto confirma que el problema no corresponde únicamente a paralizaciones recientes, sino también a obras que permanecen sin resolver durante varios periodos.


Figura 7: Frecuencia de obras paralizadas según año de paralización

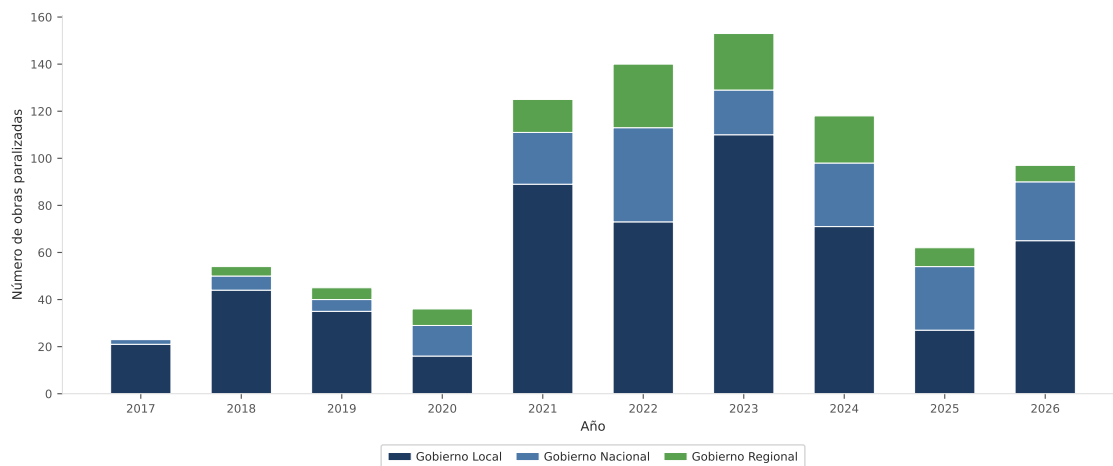


*Nota: Dentro del universo de obras paralizadas a Abril 2026, se identifica la fecha de paralización desde el primer mes y año desde que la obra se encuentra sin avance físico registrado.
Fuente: INFOBRAS V2 · Consulta Avanzada MEF*

Asimismo, el 62.1 % de las obras paralizadas registra más de 12 meses desde el último devengado, mientras que el 53.7 % registra más de 12 meses desde el último avance físico. Estos resultados refuerzan la identificación de inactividad persistente tanto en la dimensión financiera como en la dimensión física.

Figura 8: Distribución de obras paralizadas según meses desde último devengado

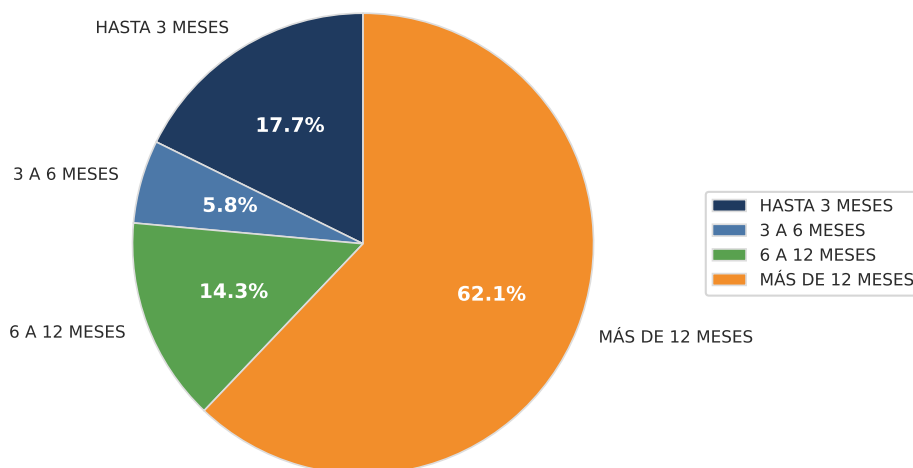

Fuente: INFOBRAS V2 · Consulta Avanzada MEF

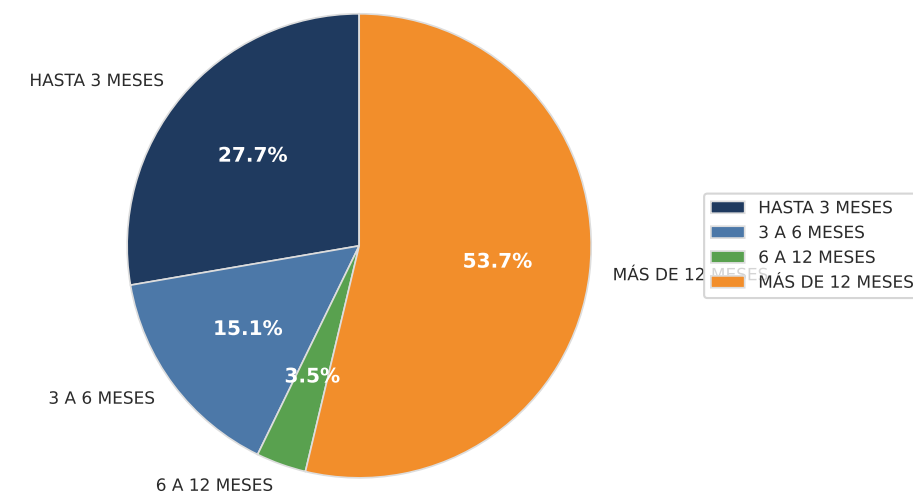Figura 9: Distribución de obras paralizadas según meses desde último avance físico

Fuente: INFOBRAS V2 - Consulta Avanzada MEF

10. Distribución regional y municipal

Dentro del ámbito regional, el ratio entre el saldo de inversión de obras paralizadas y el saldo de inversión total por entidad permite identificar qué gobiernos regionales concentran una mayor proporción de su cartera comprometida en obras sin ejecución activa. Los resultados muestran que el GORE Tacna registra el ratio más elevado, con 5.81 %, seguido por el GORE Cajamarca (4.60 %) y el GORE Madre de Dios (2.87 %). En el extremo opuesto, GORE Moquegua, GORE Loreto y GORE Pasco registran ratios inferiores al 0.10 %. Cabe destacar que el GORE Áncash, pese a ser una de las regiones con mayor cantidad de obras paralizadas, presenta un ratio de 0.64 %, dado el elevado volumen de su cartera total (S/ 24,460 millones). Este patrón sugiere que la cantidad de obras paralizadas no refleja necesariamente la magnitud relativa del problema para cada entidad.

En el ámbito municipal, el ratio entre el saldo de inversión de obras paralizadas y el saldo de inversión total por entidad revela una concentración relativa más pronunciada que en el nivel regional. La Municipalidad Distrital de Chichas registra el ratio más elevado, con 92.08 %, lo que indica que la casi totalidad de su cartera de inversión se encuentra comprometida en obras sin ejecución activa. Le siguen la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora (20.77 %) y la Municipalidad Distrital de Choros (19.32 %). Este patrón es consistente con municipalidades de menor tamaño presupuestal, donde una sola obra paralizada puede representar una fracción significativa del saldo total de inversión.

Cuadro 12: Distribución regional de obras paralizadas según cantidad y porcentaje de saldo de inversión

GORE	Nro obras paralizadas	%Obras	Saldo paralizado (S/ millones)	Saldo total (S/ millones)	Ratio (%)
GORE Tacna	2	1.89%	349.18	6,014.50	5.81%
GORE Cajamarca	11	10.38%	435.64	9,460.68	4.60%
GORE Madre de Dios	4	3.77%	117.92	4,112.59	2.87%
GORE Piura	11	10.38%	298.33	12,508.36	2.39%
GORE Huancavelica	4	3.77%	142.01	6,447.40	2.20%
GORE Ayacucho	4	3.77%	125.26	8,874.36	1.41%
GORE Lima	9	8.49%	63.94	5,968.22	1.07%
GORE Ica	2	1.89%	54.18	5,384.12	1.01%
GORE Junin	4	3.77%	241.17	27,343.71	0.88%
GORE Lima Metropolitana	1	0.94%	3.33	417.55	0.80%
GORE Amazonas	1	0.94%	2.36	340.35	0.69%
GORE Ancash	24	22.64%	156.35	24,466.74	0.64%
GORE Arequipa	9	8.49%	50.65	14,043.73	0.36%
GORE Apurimac	2	1.89%	21.06	6,578.75	0.32%
GORE Huanuco	8	7.55%	57.05	22,162.81	0.26%
GORE Cusco	2	1.89%	31.39	19,344.09	0.16%
GORE Lambayeque	5	4.72%	12.88	11,726.82	0.11%
GORE Moquegua	1	0.94%	4.80	5,410.52	0.09%
GORE Loreto	1	0.94%	6.91	39,733.13	0.02%
GORE Pasco	1	0.94%	0.84	5,351.07	0.02%
TOTAL	106	100.00%	2,175.26	235,689.49	0.92%

Nota: Se ordena por el ratio entre saldo de obras paralizadas y saldo total por entidad.

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

Cuadro 13: Ranking de municipalidades según número de obras paralizadas

Municipalidad	Nro obras paralizadas	%Obras	Saldo paralizado (S/ millones)	Saldo total (S/ millones)	Ratio (%)
Municipalidad Distrital de Chichas	1	0.14%	1.10	1.19	92.08%
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora	1	0.14%	58.19	280.18	20.77%
Municipalidad Distrital de Choros	1	0.14%	31.44	162.71	19.32%
Municipalidad Distrital de Ite	3	0.41%	65.58	420.30	15.60%
Municipalidad Provincial de Aymaraes	5	0.69%	39.60	272.93	14.51%
Municipalidad Provincial de Huaral	4	0.55%	78.89	731.01	10.79%
Municipalidad Provincial de Huaylas	1	0.14%	46.50	449.50	10.35%
Municipalidad Distrital de los Baños del Inca	5	0.69%	53.52	570.75	9.38%
Municipalidad Distrital de Huaranchal	2	0.28%	23.15	252.23	9.18%
Municipalidad Distrital de Chiguirip	1	0.14%	9.90	110.20	8.98%

Nota: Top 10 municipalidades con mayor ratio de paralización.

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

III

Conclusiones

A julio de 2026, se identificaron 1,061 obras públicas paralizadas (o en riesgo de paralización), con un saldo de inversión pendiente de ejecución de S/ 9,818 millones. Los resultados evidencian que la problemática de las obras paralizadas no puede evaluarse únicamente a partir de su cantidad, sino que requiere considerar también la magnitud financiera, el nivel de gobierno responsable, el sector, el grado de avance y el tiempo de inactividad.

En ese sentido, la distribución de las obras muestra una marcada heterogeneidad: mientras los Gobiernos Locales concentran 724 obras, equivalentes al 68.24 % del total, el Gobierno Nacional, con 213 obras, concentra el 56.03 % del saldo pendiente de inversión. Esto refleja una mayor dispersión de casos en el ámbito local y una mayor concentración financiera en proyectos de mayor escala bajo responsabilidad del Gobierno Nacional. Asimismo, la distribución del riesgo fiscal es heterogénea y se encuentra concentrada en proyectos de gran envergadura y departamentos específicos. El 10 % de las obras paralizadas concentra el 77.4 % del saldo total de inversión pendiente de ejecución, lo que evidencia el elevado peso financiero de un grupo reducido de intervenciones. A nivel departamental, Lima concentra el 14.23 % del saldo paralizado, seguida por La Libertad con 13.10 %, Áncash con 11.91 % y Piura con 10.62 %. En términos agregados, los diez departamentos con mayor saldo concentran aproximadamente el 82.1 % del monto total pendiente de ejecución. A nivel sectorial, Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento mantienen una participación relevante en los distintos niveles de gobierno, aunque en los Gobiernos Regionales el sector Salud concentra el mayor saldo pendiente.

La inactividad de las obras continúa siendo significativa y persistente en el tiempo. El 62.1 % de las obras paralizadas registra más de doce meses desde el último devengado, mientras que el 53.7 % acumula más de doce meses desde el último avance físico reportado, lo que evidencia una prolongada ausencia de ejecución tanto financiera como física. Además, la falta de priorización dentro de la cartera de inversiones se refleja en que 680 de las 1,061 obras identificadas, equivalentes aproximadamente al 64.1 %, no se encuentran incluidas en el Programa Multianual de Inversiones (PMI) vigente. La paralización tampoco es exclusiva de proyectos en sus fases iniciales; por el contrario, afecta a intervenciones que ya presentan avances físicos considerables. En efecto, 495 obras, equivalentes al 46.7 % del total, superan el 50 % de avance físico, mientras que 163 obras, correspondientes al 15.4 %, registran avances iguales o superiores al 80 % y se encuentran próximas a culminar su ejecución física.

En conjunto, estos hallazgos confirman la importancia de adoptar un enfoque integrado para la identificación y evaluación de las obras públicas paralizadas. La combinación de información sobre avance físico, inactividad financiera, modalidad de ejecución, causales de paralización y situación administrativa permite construir alertas más consistentes y reducir el riesgo de clasificar como paralizadas obras que presentan únicamente registros desactualizados. En este sentido, ninguna fuente o variable aislada resulta suficiente para diferenciar adecuadamente entre obras efectivamente paralizadas, intervenciones con señales de reactivación y aquellas próximas a culminar. Por ello, el uso articulado de distintas fuentes de información constituye un elemento fundamental para fortalecer el seguimiento, la priorización y la toma de decisiones sobre la inversión pública.

IV. Referencias

- Basel Institute on Governance. (2023). Desafíos para la ejecución de grandes proyectos de inversión desde los gobiernos subnacionales del Perú. <https://baselgovernance.org/sites/default/files/2023-02/Desafios-para-la-ejecucion-de-grandes-proyectos.pdf>
- Contraloría General de la República. *Informe de obras públicas paralizadas en el territorio nacional a marzo 2026*. Informe N.º 001-2026-CG/SESNC.
- Contraloría General de la República. Sistema de Información de Obras Públicas - Infobras.
- Ministerio de Economía y Finanzas. Consulta Avanzada del Banco de Inversiones.
- Ministerio de Economía y Finanzas. Sistema de Seguimiento de Inversiones - Formato 12-B.

V. Anexos

1. Anexo A: Diccionario mínimo de variables

Variable	Descripción	Fuente o regla
cod_obra	Código de obra	Infobras
cui	Código Único de Inversiones	Infobras / Banco de Inversiones
nomb_obra	Nombre de obra	Infobras
entidad	Entidad ejecutora	Infobras
nivel_gobierno	Nivel de gobierno	Banco de Inversiones / ubigeo
sector	Sector de gobierno	Infobras / Banco de Inversiones
costo_act	Costo actualizado	Consulta Avanzada MEF
deveng_acum	Devengado acumulado	Consulta Avanzada MEF
saldo_inversion	Costo actualizado menos devengado acumulado	Calculado
porc_inversion	Devengado acumulado sobre costo actualizado	Calculado
avance_fisico	Porcentaje de avance físico	Infobras / SSI
saldo_fisico	100 menos avance físico	Calculado
ult_deveng	Fecha de último devengado	Consulta Avanzada MEF
meses_ult_deveng	Meses desde último devengado hasta diciembre 2025	Calculado
ult_est_sit	Último estado situacional	SSI / web scraping
fech_est_sit	Fecha del estado situacional	SSI / web scraping
estado_obra	Clasificación final	Regla metodológica / análisis
causal_paralizado	Causal de paralización	Infobras / análisis
apoyo	Indicador de apoyo para decisión	Calculado
ley31589	Potencial aplicación de Ley N.º 31589	Calculado / análisis

2. Anexo B: Obras paralizadas pertenecientes a un mismo proyecto de inversión

Se presenta la lista de obras paralizadas pertenecientes a proyectos de inversión con más de una obra pública asociada. Algunos criterios de este documento consideran el avance financiero sobre el costo actualizado total de la inversión y no únicamente sobre cada obra individual.

CUI	Nombre de obra	Descripción de la inversión	Entidad ejecutora	Codigo INFOBRAS	Dif (%)	Costo actualizado	Monto de expediente tecnico
2234985	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N3 (DV. HUANCABAMBA) BUENOS AIRES SALTITRAL CANCHAQUE EMP. PE 3N HUANCABAMBA- TRAMO KM 71. 600 HUANCABAMBA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALTITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA	PROVIAS Nacional	87846	11.27%	575,254,080	516,975,680
2290818	Mejoramiento de la Carretera (PU-135) Checca - Mazocruz	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	PROVIAS Nacional	76057	13.13%	452,914,528	400,331,680
2266697	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS- DISTRITO DE OLMOS- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- Adm. General	43122	0.00%	374,399,904	374,399,904
2234988	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10- TRAMO: SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10	PROVIAS Nacional	142784	111.08%	759,394,888	359,766,784
2192844	COMPONENTE 01. 02 Y 04. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA TACNA REGION TACNA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA	GORE Tacna	83130	122.81%	633,486,464	284,322,496
2234988	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO EMP. RUTA 10- TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10	PROVIAS Nacional	81363	175.05%	759,394,888	276,089,184
2376184	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA QUERECOTILLO- SALTITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALTITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	168784	0.00%	242,928,464	242,928,464
2498739	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RIO CA ETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CA ETE LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CA ETE NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA PAQUETE 04	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE -DEPARTAMENTO DE LIMA	de Autoridad Infraestructura	507220	144.57%	558,523,264	228,370,224
2498739	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RIO CA ETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CA ETE LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CA ETE NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA PAQUETE 03	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE -DEPARTAMENTO DE LIMA	de Autoridad Infraestructura	507219	144.57%	558,523,264	228,370,224
2404452	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE CIENEGUILLA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA	Serv Agua Potab y Alcant de Lima-Sedapal	65265	5.11%	173,182,880	182,507,040
2434227	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA- DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA- DEPARTAMENTO DE PIURA	RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	GORE Piura	106350	0.00%	155,225,936	155,225,936
2197523	SALDO DE OBRA DE LA INVERSION: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP- AREQUIPA"	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - AREQUIPA	Oficina General de Infraestructura (M.Del Interior)	156639	0.00%	150,957,584	150,957,584
2434215	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA- DISTRITO HUARMACA- PROVINCIA HUANCABAMBA	MEJORAMIENTO RH DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	GORE Piura	106961	0.00%	149,543,328	149,543,328
2434225	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA	REH -MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	GORE Piura	106971	0.00%	139,108,064	139,108,064
2498739	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RIO CA ETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CA ETE LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CA ETE NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA PAQUETE 02	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE -DEPARTAMENTO DE LIMA	de Autoridad Infraestructura	507218	329.42%	558,523,264	130,065,088
2382190	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO AREQUIPA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO AREQUIPA	Municipalidad Distrital de Sachaca	133701	12.29%	131,373,744	116,999,120
2499886	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RIO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEPARTAMENTO DE LIMA PAQUETE 05	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA	de Autoridad Infraestructura	509993	458.05%	635,414,080	113,862,568
2176842	INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL	INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	Municipalidad Provincial de Huaral	85226	0.00%	106,459,968	106,459,968

CUI	Nombre de obra	Descripción de la inversión	Entidad ejecutora	Código INFOBRAS	Diff (%)	Costo actualizado	Monto de expediente técnico
2112981	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 103 EM PE 06B SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA ROMERO CIRCA LA LAGUNA TONGOD CATILLUC EMP PE 06 C EL EMPALME CAJAMARCA SALDO DE OBRA	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103; EM PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA	GORE Cajamarca	139433	241.26%	352,845,920	103,396,488
2194680	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUNDO NIVEL DE ATENCION AYNA LA MAR AYACUCHO	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO	GORE Ayacucho	154325	155.98%	233,755,264	91,316,232
2328824	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01 02 03 06 08 09 Y 12 DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA TRUJILLO LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	Municipalidad Distrital Florencia de Mora	80957	57.20%	120,903,040	76,910,776
2307711	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Municipalidad Provincial Sechura	122424	0.00%	60,404,252	60,404,252
2078794	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA PUCACACA CHINCHA ALTA SHIMBILLO NVO CODO PICOTA SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PIOCTA SAN MARTIN	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN	Municipalidad Provincial de Picota	80624	7.43%	57,830,336	53,828,880
2498739	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DEL RIO CA ETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CA ETE LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE NUESTRO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA PAQUETE 01	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	Autoridad Nacional Infraestructura	141927	982.64%	558,523,264	51,588,800
2235046	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ DISTRITO DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	Municipalidad Provincial Huaylas - Caraz	171679	84.26%	79,672,896	43,238,964
2286058	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS PATRÓN SANTIAGO EL SALVADOR LOS ALAMOS WICHAYPAMPA SE OR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC II ETAPA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	Programa Nacional Saneamiento Urbano	88251	143.67%	105,108,792	43,136,388
2180981	MEJORAMIENTO- AMPIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES- CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUES ZONAL LLOQUE YUPANQUI- DISTRITO DE LOS OLIVOS- PROVINCIA DE LIMA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Municipalidad Metropolitana Lima	518750	44.88%	57,876,764	39,949,304
2164917	CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA- PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	GORE Huanuco	111227	12.45%	36,924,308	32,836,080
2403508	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA	Serv Agua Potab y Alcant Lima-Sedapal	88099	57.21%	50,086,672	31,859,374
2188775	ETAPA II MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA SUCASCO Y ALMOZANCHE DISTRITO DE COATA PUNO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA, SUCASCO Y ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA - PUNO - PUNO	Programa Nacional Saneamiento Urbano	127463	181.37%	89,540,208	31,823,456
2486784	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV ECOLOGICA Y AV MUNICIPAL TRAMO AV HUMBOLDT AV ECOLOGICA AV CORONEL GREGORIO ALBARRACIN DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV ECOLOGICA Y AV MUNICIPAL TRAMO AV HUMBOLDT AV ECOLOGICA AV CORONEL GREGORIO ALBARRACIN DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	139080	132.33%	73,399,104	31,593,108
2426758	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA - ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA - ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Municipalidad Distrital Angamarca	170078	51.38%	46,554,880	30,753,318
2450749	RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-712 (EMP-PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP-PI-717 (MEJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA- PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N2450749	RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-712 (EMP-PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP-PI-717 (MEJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA- PIURA	GORE Piura	118050	0.00%	28,552,778	28,552,778
2131606	Saldo de Obra II "Adecuación- Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Carlos Augusto Salaverry - Sullana - Sullana - Piura".	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE SULLANA Y DISTRITO DE SULLANA	M.E.-Programa Nacional Infraestructura Educativa	158970	251.87%	96,011,592	27,286,216

CUI	Nombre de obra	Descripción de la inversión	Entidad ejecutora	Codigo INFOBRAS	Diff (%)	Costo actualizado	Monto de expediente tecnico
2175165	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA- PROVINCIA DE LIMA - LIMA- TRAMO II: AV. ELIAS APARICIO - JR. MADRE SELVA- ETAPA III: JR. PARACAS - JR. MADRE SELVA"	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Municipalidad Metropolitana de Lima	156592	216.27%	81,149,472	25,658,070
2468309	MEJORAMIENTO REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 32 KM EN CAMINO VECINAL EMPALME 105 CHARAT - CALLANCAS DEL DISTRITO DE CHARAT - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 32 KM EN CAMINO VECINAL EMPALME 105 CHARAT - CALLANCAS DEL DISTRITO DE CHARAT - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Municipalidad Disrital de Charat	129034	0.19%	24,494,248	24,447,820
2430098	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE- TRAMO PUENTE SOCSI- PUENTE SAN JERÓNIMO. EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE- DEPARTAMENTO DE LIMA	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE- TRAMO PUENTE SOCSI- PUENTE SAN JERÓNIMO. EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	GORE Lima	121533	61.96%	37,090,844	22,901,086
2338414	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA- OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua	113323	15.44%	25,558,358	22,139,258
2484038	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 64 33 KM EN VILLATAMBO CHUQUIMARAN CAJA UCHUYTAMBO EN EL DISTRITO LEONCIO PRADO Y SANTA LUCIA PROVINCIA LUCANAS REGIÓN AYACUCHO	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 64.33 KM EN VILLATAMBO - CHUQUIMARAN - CAJA - UCHUYTAMBO - EMP. AY 114	GORE Ayacucho	123821	32.23%	26,470,720	20,018,588
2556261	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3- DISTRITO DE MANCOS- PROVINCIA DE YUNGAY- REGIÓN ANCASH	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH	GORE Ancash	173788	43.59%	28,142,312	19,599,680
2461168	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	Municipalidad Distrital de Ite	149576	29.88%	24,266,070	18,682,918
2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS- VEREDAS- GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS- PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	GORE Ancash	76430	47.55%	26,948,834	18,263,736
2279986	CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN	CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN	GORE Junin	49972	0.55%	18,130,608	18,030,608
2486774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLAMA PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLAMA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Municipalidad Distrital de Llama	507512	14.29%	19,029,152	16,650,172
2231851	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE EL TUCO, TUCO BAJO NUEVA ESPERANZA LA RAMADA Y SANTA ROSA EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC REGION CAJAMARCA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA	GORE Cajamarca	122559	79.21%	28,404,266	15,849,786
2402879	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS E LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI- DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA CONDESUYOS DEPARTAMENTO AREQUIPA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	GORE Arequipa	131469	8.22%	16,893,716	15,609,811
2237777	INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE MONTANGO PRIMAVERA LAS CHONTAS PUYAYA LA HACIENDA BARRIO NUEVO LA UNION Y BUENOS AIRES DISTRITO DE SANTA ROSA JAEN CAJAMARCA	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE MONTANGO PRIMAVERA LAS CHONTAS,PUYAYA,LA HACIENDA,BARRIO NUEVO,LA UNION Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA	Municipalidad Distrital de Santa Rosa	140510	6.33%	15,325,458	14,413,356
2166795	AMPLIACION Y RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA	AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY,PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA	Municipalidad Provincial Caylloma - Chivay	84665	84.73%	25,636,378	13,877,763
2182732	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA DISTRITO DE COMAS PROVINCIA DE LIMA LIMA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Municipalidad Metropolitana de Lima	125078	515.01%	84,496,632	13,738,982
2342226	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA DISTRITO DE CHALLHUACHO COTABAMBAS APURIMAC	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA, DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	Municipalidad Distrital de Chalhuancho	149654	2.93%	13,069,591	12,697,050
2503439	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL P1605 TRAYECTORIA EMP P1587 EL ALUMBRE NARANJO DE ROMERO EMP P1588 DISTRITO DE LANCONES PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL P1-605 TRAYECTORIA EMP P1-587 – EL ALUMBRE – NARANJO DE ROMERO EMP. P1-588, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	GORE Piura	162627	1.29%	12,327,599	12,170,781

CUI	Nombre de obra	Descripción de la inversión		Entidad ejecutora	Codigo INFOBRAS	Diff (%)	Costo actualizado	Monto de expediente tecnico
2164452	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUACANA, DISTRITO DE HUACANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUACANA, DISTRITO DE HUACANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUACANA, DISTRITO DE HUACANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	Gob.Reg. Apurimac- Sub Region Chincheros	115988	1.46%	12,222,474	12,046,474
2180981	MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA LIMA	MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA LIMA	MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA LIMA	Municipalidad Metropolitana de Lima	125079	409.12%	57,876,764	11,366,069
2404240	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA- DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO- REGIÓN HUÁNUCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA- DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO- REGIÓN HUÁNUCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA- DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO- REGIÓN HUÁNUCO	GORE Huauuco	131582	1.35%	11,505,269	11,351,873
2329601	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	GORE Huancavelica	36770	44.60%	16,366,854	11,318,403
2436571	SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	REHABILITACIÓN DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	REHABILITACIÓN DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	PROVIAS Descentralizado	511408	0.00%	11,039,393	11,039,393
2436581	SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	REHABILITACIÓN DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	REHABILITACIÓN DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	PROVIAS Descentralizado	510774	0.00%	10,577,466	10,577,466
2237180	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA 2DA ETAPA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA 2DA ETAPA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	Municipalidad Distrital de Carabayllo	145505	125.67%	22,787,802	10,097,622
2380557	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR 606 DISTRITO DE PAMPAMARCA - PROVINCIA LA UNIÓN REGIÓN AREQUIPA - I ETAPA	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR 606 DISTRITO DE PAMPAMARCA - PROVINCIA LA UNIÓN REGIÓN AREQUIPA - I ETAPA	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606; DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNIÓN – REGION AREQUIPA	GORE Arequipa	102020	97.11%	18,213,246	9,240,112
2431423	EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES ¿ TUMBES."	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES ¿ TUMBES."	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES ¿ TUMBES.	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- Adm. General	518268	68.16%	15,113,858	8,387,567
2317168	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III SECTOR 01 DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III SECTOR 01 DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA	Municipalidad Distrital Veintiseis de Octubre	152150	443.69%	43,908,456	8,076,045
2160782	SALDO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL"	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	Oficina General de Infraestructura (M.Del Interior)	168936	193.45%	23,615,072	8,047,472
2083424	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0000-5890.35 DISTRITO DE MADRIGAL - PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0000-5890.35 DISTRITO DE MADRIGAL - PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0-00 – 5+890.35 DISTRITOS DE MADRIGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	Municipalidad Distrital de Madrigal	130685	16.14%	9,146,647	7,875,592
2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE - ANTAPACCHA - AMPAS - CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE - ANTAPACCHA - AMPAS - CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	GORE Ancash	153256	11.52%	8,746,832	7,843,220
2225169	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA- DISTRITO DE SHILLA- PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA- DISTRITO DE SHILLA- PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	GORE Ancash	162699	10.21%	8,058,860	7,312,222
2453739	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LOS JIRONES Y PASAJES DE LA URBANIZACION ESPINAL Y ANEXO LOS CHOFERES DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LOS JIRONES Y PASAJES DE LA URBANIZACION ESPINAL Y ANEXO LOS CHOFERES DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LOS JIRONES Y PASAJES DE LA URBANIZACION ESPINAL Y ANEXO LOS CHOFERES DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	Municipalidad Provincial de San Roman - Juliaca	518074	0.59%	7,322,216	7,279,416
2279438	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA - DISTRITO DE CHALA- PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA - SALDO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA - DISTRITO DE CHALA- PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA - SALDO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA	GORE Arequipa	147052	865.35%	69,842,512	7,234,949
2195414	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA HUINCHOS PATACCOCHA Y CCOLLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA HUINCHOS PATACCOCHA Y CCOLLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA, HUINCHOS, PATACCOCHA Y CCOLLA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS -, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	Municipalidad Provincial de Andahuaylas	83365	0.00%	7,111,396	7,111,396
2436583	SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - - ANCASH)	REHABILITACIÓN DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - - ANCASH)	REHABILITACIÓN DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - - ANCASH)	PROVIAS Descentralizado	510784	0.00%	6,963,120	6,963,120
2166853	Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos-Canal El Tigre-Ucubamba-Amazonas	Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos-Canal El Tigre	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE	Programa de Desarrollo Agrario - Agrorural	74319	309.02%	28,416,614	6,947,500

CUI	Nombre de obra	Descripción de la Inversión	Entidad ejecutora	Código INFOBRAS	Diff (%)	Costo actualizado	Monto de expediente técnico
2389090	SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO DE LA LIBERTAD". CUI 2389090	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Municipalidad Distrital de Chao	538008	5.65%	6,883,832	6,515,570
2069706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS- TRANCA SASAPE- TRANCA FANUPE- CASA BLANCA- FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS- DISTRITO DE MORROPPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - SALDO DE OBRA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS, TRANCA SASAPE, TRANCA FANUPE, CASA BLANCA, FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS, DISTRITO DE MORROPPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	Municipalidad Distrital de Morrope	105461	259.15%	23,051,498	6,418,290
2079627	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERE A Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ILABAYA Y LOCUMBA EN LOS SECTORES DE CHEJAYA ILABAYA MIRAVE Y OCONCHAY DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE TACNA TRAMO III PROG 11 800 AL 14 700	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ILABAYA Y LOCUMBA EN LOS SECTORES DE CHEJAYA, ILABAYA, MIRAVE Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	Municipalidad Distrital de Ilabaya	82631	1039.52%	71,047,608	6,234,888
2601594	RENOVACION DE LINEA PRIMARIA- EN EL(LA) ALIMENTADOR M202 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA- EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS- PROVINCIA MANU- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR M202 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.	507094	0.00%	6,195,850	6,195,850
2475279	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 14663 SERRAN DEL DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 14663 SERRAN DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	GORE Piura	142757	72.50%	10,664,458	6,182,135
2436584	SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	REHABILITACION DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	PROVIAS Descentralizado	510804	0.00%	6,165,368	6,165,368
2291393	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	GORE Lambayeque	145553	15.67%	6,832,032	5,906,462
2219690	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA - RAYOS - JATUNHUASI - LA FLORIDA - AJO SPAMPA- DEL DISTRITO DE ANDAMARCA- PROVINCIA DE CONCEPCION- REGION JUNIN - IV ETAPA	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA- RAYOS- JATUNHUASI- LA FLORIDA- AJO SPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGAO, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN	Municipalidad Andamarca	131298	576.27%	39,890,660	5,898,602
2226795	SALDO DE LA OBRA REHABILITACION MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY YARINA PUERTO LIBRE DISTRITO DE CONSTITUCION OXAPAMPA PASCO	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY - YARINA - PUERTO LIBRE, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO	Municipalidad Constitucion	535053	93.61%	10,486,346	5,416,268
2328805	MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO- DISTRITO DE HUACHO- PROVINCIA DE HUAJARA-LIMA	MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAJARA - LIMA	GORE Lima	101653	50.40%	8,035,134	5,342,670
2395593	Renovación de Colector Secundario en la Urbanización La Florida del distrito del Rimac- Provincia Lima Departamento Lima	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) URBANIZACION LA FLORIDA DEL DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Serv Agua Potab y Alcant de Lima-Sedapal	167561	50.46%	8,033,310	5,339,190
2292563	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHISCAHUAYLLA Y CHUYLLULLU- DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHISCAHUAYLLA Y CHUYLLULLU, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC	Municipalidad Coyllurqui	66128	97.34%	10,286,480	5,212,654
2267487	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO - JAUJA - JUNIN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA - JUNIN	Municipalidad Muquiyauyo	90758	0.00%	5,161,932	5,161,932
2150105	SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA MAMAYAYQUE DEL PROYECTO DE CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAYQUE DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI REGION AMAZONAS	CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAYQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS	Servicio Nacional de Capacitacion Para la Industria de la Construcion	145635	67.76%	8,624,998	5,141,130
2436570	SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE PUENTE SOLVIN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	REHABILITACION DE PUENTE SOLVIN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	PROVIAS Descentralizado	511169	0.00%	4,616,433	4,616,433
2405560	Saldo de obra ¿CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA- PROVINCIA DE LIMA¿	CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA - ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Seguro Social de Salud - Essalud	512727	461.69%	25,838,052	4,600,015
2237663	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUILAGAN- EL GUAYO- EL CORRAL- LA SUCCHA Y LA SHILLA- DISTRITO DE QUEROOCOTILLO - CUTERVY - CAJAMARCA - DESAGREGADO I	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUILAGAN, EL GUAYO, EL CORRAL, LA SUCCHA Y LA SHILLA, DISTRITO DE QUEROOCOTILLO - CUTERVY - CAJAMARCA	Municipalidad Distrital Queroocotillo	518430	178.94%	12,182,468	4,367,340
2406476	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-636 - KM. 0-000 HASTA KM. 9-200 EN EMP. AR-106 (DV. HUAMI - PAMPACHACRA) DISTRITO VIRACO - PROVINCIA CASTILLA REGION AREQUIPA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-636, KM 0-000 HASTA KM 9-200, EN EMP. AR-106 (DV. HUAMI- PAMPACHACRA) - DISTRITO DE VIRACO - PROVINCIA DE CASTILLA - REGION AREQUIPA	GORE Arequipa	86297	73.96%	7,593,376	4,365,134
2312296	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO LIMA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA, CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO LIMA	GORE Lima	63768	16.63%	5,051,763	4,331,395

CUI	Nombre de obra	Descripción de la inversión		Entidad ejecutora	Código INFOBRAS	Diff (%)	Costo actualizado	Monto de expediente técnico
2406462	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS DE PAMPA ALACOCHA- RAPAZ Y CHUPAPUCRO EN EL DISTRITO DE OYON- PROVINCIA DE OYÓN REGION LIMA	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS DE PAMPA ALACOCHA, RAPAZ Y CHUPAPUCRO EN EL DISTRITO OYON, PROVINCIA DE OYÓN-REGION LIMA		GORE Lima	94529	213.55%	13,050,316	4,162,128
2333725	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA - DISTRITO DE CHAGLLA- PROVINCIA DE PACHITEA - REGION HUANUCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA - DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA - REGION HUANUCO		GORE Huanuco	133898	20.73%	4,975,933	4,121,414
2200925	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y PEATONAL ENTRE LA AV FRANCISCO MOSTAJO 15 DE AGOSTO A H VILLA ASUNCION CON LA CALLE N 4 DE LA AV A ASPA EL HUARANGAL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE	CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL Y PEATONAL ENTRE LA AV. FRANCISCO MOSTAJO - AV. 15 DE AGOSTO A.H. VILLA ASUNCION CON LA CALLE N 4 DE LA AV. A ASPA EL HUARANGAL, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA		Municipalidad Distrital de Selva Alegre	82679	218.69%	13,121,679	4,117,326
2236191	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20 PROVINCIA DE CAJAMARCA	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA		Municipalidad Provincial de Cajamarca	138353	88.90%	7,714,722	4,083,987
2026943	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION		GORE Lima	503985	363.71%	18,753,252	4,044,168
2436637	REHABILITACIÓN DE PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	REHABILITACIÓN DE PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)		PROVIAS Descentralizado	101771	45.15%	5,794,350	3,991,996
2324802	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CORIS DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS PROVINCIA DE CHURCAMPA HUANCVELICA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CORIS DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCVELICA		Municipalidad Distrital de San Pedro de Coris	151419	12.25%	4,478,111	3,989,300
2462781	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE 032 APRENDIZAJE LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA REGION PIURA CL 410078 FUR 2462781	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 410078		M.E.-Programa Nacional Infraestructura Educativa	122305	48.69%	5,365,856	3,608,855
2194931	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN AGRARIA INFORMACIÓN AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA EXPEDIENTE META IV	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA		GORE Lima	63649	709.84%	28,196,516	3,481,727
2319748	SALDO DE OBRA DEL PIP : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- DISTRITO DE TRUJILLO- PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO		Universidad Nacional de Trujillo	509892	249.92%	11,867,700	3,391,506
2235746	Saldo de Obra: Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la ruta turística del Valle del Colca en el casco urbano de la localidad de Chivay- provincia de Caylloma- región Arequipa - Restauración e iluminación Artística del Templo de Nuestra señora de la Asunción de Chivay SNIP 289798	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA TURISTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA RUTA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA		Unidad Ejecutora de inversion en Comercio Exterior y Turismo (Uicet)	515827	413.78%	17,280,972	3,363,494
2202218	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GOLPAPUQUIO DISTRITO DE OYON PROVINCIA DE OYON LIMA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GOLPAPUQUIO, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA		Municipalidad Provincial de Oyon	84252	176.35%	9,289,942	3,361,708
2485980	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTION DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EQUIPO MECANICO Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA- PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTION DE SERVICIOS DEL AREA DE EQUIPO MECANICO Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO		Municipalidad Provincial de Sandia	124502	2.01%	3,356,250	3,290,271
2201410	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUBSECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE LA ESTACION DE BOMBEO EB 03 MEDIANTE LA IMPULSION DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB 02 AL RESERVORIO R 9 EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA TACNA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUBSECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA IMPULSION DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVORIO R-9 EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, TACNA- TACNA		Ent. Prest. Servicios Saneamiento Tacna S A	512955	84.24%	5,992,486	3,252,585
2192472	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA- DISTRITO DE SAPALLANGA- PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN		Municipalidad Provincial de Huancayo	71283	102.20%	6,394,596	3,162,503
2299423	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE VENTILLA I VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI CENTRO POBLADO DE YOROHOCO DISTRITO DE HUACULLANI PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO		Programa Saneamiento Rural	69551	73.93%	5,405,748	3,107,938
2440674	REHABILITACION DE PUENTE POCOCRO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2)	REHABILITACION DE PUENTE POCOCRO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 ¿ HUANCVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)		PROVIAS Descentralizado	105956	63.38%	5,024,073	3,075,151

CUI	Nombre de obra	Descripción de la inversión	Entidad ejecutora	Código INFOBRAS	Diff (%)	Costo actualizado	Monto de expediente técnico
2512288	CREACION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUURI Y SECTOR DE PUCARA DEL DISTRITO DE CURPAHUASI - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	CREACION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUURI Y SECTOR DE PUCARA DEL DISTRITO DE CURPAHUASI - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	Municipalidad Distrital de Curpahuasi	165185	0.00%	3,068,091	3,068,091
2150105	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE MAMAYAQUE Y HUAMPAMI REGION AMAZONAS	INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDONCANQUI, REGION AMAZONAS	Servicio Nacional de Capacitación Para la Industria de Construcción	30347	182.75%	8,624,998	3,050,426
2194931	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA META II CONSTRUCCION SEDE CENTRAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA	GORE Lima	119435	827.53%	28,196,516	3,039,961
2202093	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP N 72763 DE LA LOCALIDAD DE COASA DISTRITO DE COASA CARABAYA PUNO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P. 72763 DE LA LOCALIDAD DE COASA, DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO	Municipalidad Distrital de Coasa	83085	0.00%	3,016,191	3,016,191
2436577	REHABILITACION DE PUENTE ARMA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH	REHABILITACIÓN DE PUENTE ARMA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH	PROVIAS Descentralizado	102823	78.62%	5,313,418	2,974,702
2299942	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUI ONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO SICUYANI DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUIÑONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	Programa Nacional Saneamiento Rural	69548	54.39%	4,539,330	2,940,107
2533264	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PU 1220 CORREDOR VIAL ECONOMICO ACORA MOLLOCCO MARCA ESQUE A CULTA AMPARANI ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PU 1220: CORREDOR VIAL ECONOMICO ACORA - MOLLOCCO - MARCA ESQUEÑA - CULTA - AMPARANI - ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	Municipalidad Distrital de Acora	507857	0.00%	2,939,574	2,939,574
2189448	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA KAMANI Y CENTRAL VILACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE DISTRITO HUACULLANI CHUCUITO PUNO	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	Programa Nacional Saneamiento Rural	66992	149.31%	7,326,494	2,938,650
2335767	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR DISTRITO DE SAN SALVADOR CALCA CUSCO	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO	Municipalidad Distrital de San Salvador	77214	8.79%	2,620,048	2,872,400
2467139	CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL RED VIAL VELACUNCA KM 0 000 CHALLUTA KM 5 347 EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA ALTA Y RED VIAL OQUEBAMBA KM 0 000 CHALLUTA SOTOPATA KM 9 070 DE LA COMUNIDAD DE ALCASANA DE LOS DISTRITOS DE ALTO PICHIGUA Y DISTRITO DE PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO	CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL RED VIAL VELACUNCA (KM 0+000) - CHALLUTA (KM 5+347) EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA ALTA Y RED VIAL OQUEBAMBA (KM 0+000) - CHALLUTA - SOTOPATA (KM 9+070) DE LA COMUNIDAD DE ALCASANA DE LOS DISTRITOS DE ALTO PICHIGUA Y DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Municipalidad Distrital de Pichigua	162837	0.00%	2,837,232	2,837,232
2425619	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO- PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Programa Subsectorial de Irrigación - Psi	88384	18.05%	3,321,489	2,813,742
2207083	SALDO DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE- DISTRITO DE CURIMANA- PADRE ABAD- UCAYALI	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALI	Municipalidad Distrital de Curimana	159071	146.19%	6,871,399	2,791,101
2434455	SALDO DE OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES.	Ministerio de Construcción y Saneamiento-Adm. General	509341	154.99%	7,000,186	2,745,265
2280252	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I E N 38994/MX P DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS I.E. N° 38855/MX-P DE UNION CERRO DE ORO, N° 38564/MX-P DE ISOCACSA, N° 38994/MX-P DE MIRAFLORES Y 38864/MX-P DE SAN JOSE DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	Municipalidad Distrital de Anchihuay	134485	265.20%	9,825,502	2,690,453
2481725	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA MU OZ NAJAR DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA MUÑOZ NAJAR DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	Municipalidad Provincial de Puno	501277	14.96%	3,054,695	2,657,130
2149878	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE - SEGUNDA ETAPA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	165852	362.20%	12,264,073	2,653,394
2192559	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA BAO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN BAO HUALA Y CENTRO HUALA DISTRITO DE FRIAS AYABACA PIURA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA- BAO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN, BAO HUALA Y CENTRO HUALA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	Programa Productivo Agrario de Desarrollo Rural - Agrorural	71480	106.36%	5,449,912	2,641,000

CUI	Nombre de obra	Descripción de la inversión	Entidad ejecutora	Código INFOBRAS	Diff (%)	Costo actualizado	Monto de expediente técnico
2409135	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA COLECTOR SECUNDARIO Y EMISARIO EN EL LA AREA DE INFLUENCIA DE LA EPSE EMAPA CA ETE S A DISTRITO DE SAN VICENTE DE CA ETE PROVINCIA CA ETE DEPARTAMENTO LIMA	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA COLECTOR SECUNDARIO Y EMISARIO EN EL LA AREA DE INFLUENCIA DE LA EPSE EMAPA CA ETE S A DISTRITO DE SAN VICENTE DE CA ETE PROVINCIA CA ETE DEPARTAMENTO LIMA	Programa Nacional Saneamiento Urbano	91603	220.70%	8,159,927	2,544,445
2505674	CONTRATACION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO PIURA	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA PAITA DEPARTAMENTO PIURA	Zona Especial de Desarrollo Paíta Zed Paíta	178051	51.24%	3,687,228	2,437,986
2161906	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA.	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA.	Sedapar S.A.	66138	203.20%	7,261,377	2,394,923
2331822	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA-DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	Municipalidad Distrital de Vilcabamba	116018	107.74%	4,722,395	2,273,246
2189448	SALDO DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA KAMANI Y CENTRAL VILACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE DISTRITO HUACULLANI CHUCUITO PUNO CUI 2189448	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	Programa Nacional Saneamiento Rural	542940	234.31%	7,326,494	2,191,549
2196389	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE GANADO EN LA CIUDAD DE ILAVE- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE GANADO EN LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	Municipalidad Provincial el Collao - Ilave	85577	35.63%	2,959,632	2,182,136
2177032	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LOS AA.HH. EL ANGEL CONTIGO PERU LA HUACA, ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA META III ETAPA AA HH EL ANGEL	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LOS AA.HH. EL ANGEL, CONTIGO PERU, LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	GORE Lima	86545	895.72%	21,336,376	2,142,800
2186458	SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBO VALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBORANDE PROVINCIA PIURA DEPARTAMENTO PIURA	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBO-VALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBORANDE PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Programa Subsectorial de Irrigacion - Psi	546167	106.48%	4,235,556	2,051,315
2388576	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MALECON JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE CERRO AZUL-PROVINCIA DE CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA - META II	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MALECON JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	Municipalidad Distrital de Cerro Azul	162827	307.52%	7,619,163	1,869,664
2251640	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	114855	530.35%	11,682,130	1,853,285
2301830	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA PROGRAMA 004 MACROMEDICION Y BALANCE HIDRICO DE LOS RESERVORIOS N28- N49- R27- R33- R35- R1- N29- R34- N26- N42- R13C- N5- N8- N49A- CAPTACION DE CHIGUATA-Y LA LINEA DE CONDUCCION L-2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA PROGRAMA 004 MACROMEDICION Y BALANCE HIDRICO DE LOS RESERVORIOS N28- N49- R27- R33- R35- R1- N29- R34- N26- N42- R13C- N5- N8- N49A- CAPTACION DE CHIGUATA-Y LA LINEA DE CONDUCCION L-2	Sedapar S.A.	177883	2702.40%	50,015,072	1,784,724
2496392	CREACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE FERRENAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CREACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE FERRENAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo	136813	3.92%	1,616,716	1,555,681
2333643	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA-PERCCAHUATAY- DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU - APURIMAC	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA-PERCCAHUATAY, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU - APURIMAC	Municipalidad Distrital de Gamarra	69614	0.00%	1,539,782	1,539,782
2299423	SALDO DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI CENTRO POBLADO DE YOROHOCO DISTRITO DE HUACULLANI PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	Programa Nacional Saneamiento Rural	500059	255.03%	5,405,748	1,522,612
2505674	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA- EN LA LOCALIDAD DE PAITA- DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- DEPARTAMENTO DE PIURA - PRIMERA ETAPA- CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2505674	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA	Zona Especial de Desarrollo Paíta - Zed Paíta	152794	143.13%	3,687,228	1,516,547
2494310	MEJORAMIENTO DE LAS 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LA CUENCA BAJA DEL RIO TAMBO- DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - II ETAPA ITEM N 02 I.E. N 31957 SELVA VERDE.	MEJORAMIENTO DE LAS 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LA CUENCA BAJA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - II ETAPA	Municipalidad Distrital de Río Tambo	151241	422.67%	7,134,386	1,365,001
2249687	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRÓN MUELLE CUADRAS 1 AL 6 Y JIRON COMERCIO CUADRAS 4, 5 Y 6 DE LA LOCALIDAD DE CHUCUITO DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO SEGUNDA ETAPA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRÓN MUELLE (CUADRAS 1 AL 6) Y JIRON COMERCIO (CUADRAS 4, 5 Y 6), DE LA LOCALIDAD DE CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO	Municipalidad Distrital de Chucuito	171793	0.00%	1,363,163	1,363,163

CUI	Nombre de obra	Descripción de la inversión		Entidad ejecutora	Codigo INFOBRAS	Diff (%)	Costo actualizado	Monto de expediente tecnico
2517930	CREACION DEL SERVICIO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TARUCUYO DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CREACION DEL SERVICIO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TARUCUYO DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO		Municipalidad Coporaque Distrital	523388	0.00%	1,282,007	1,282,007
2495583	SALDO DE OBRA REPARACIÓN DE ARMADO DE ALUMBRADO PÚBLICO- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE LINCE- DISTRITO DE LINCE- PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA	REPARACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		Municipalidad Distrital de Lince	174106	37.01%	1,725,315	1,259,254
2217630	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO		Municipalidad Leoncio Prado - Rupa Rupa	59335	7.84%	1,333,566	1,236,614
2080449	CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS GRADERIOS Y CANALIZACION EN LOS JIRONES HUANCAYO PALOMANI CANCHARANI Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO VALLECITO CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO EN LOS JIRONES HUANCAYO, PALOMANI, CANCHARANI Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO VALLECITO, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIOS Y CANALIZACION EN LOS JIRONES HUANCAYO, PALOMANI, CANCHARANI Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO VALLECITO, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		Municipalidad Provincial de Puno	537118	291.98%	4,681,480	1,194,315
2274848	PRESTACIONES PENDIENTES DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PAITA (DESDE LA SET PAITA - HOSPITAL LAS MERCEDES)- SET POECHOS (19N)- Y SET SULLANA (13N)- PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA	INSTALACION DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PAITA - DESDE LA SET PAITA - HOSPITAL LAS MERCEDES - SET POECHOS - 19N, Y SET SULLANA - 13N, PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA		Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Nor-Oeste del Perú S.A.	157699	97.06%	2,338,081	1,186,456
2471302	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. MARISCAL CÁCERES PASAJE MADRID DEL BARRIO SANTA ANA PASAJE CRISOSTOMO PASAJE TOMÁS BELLIDO EN EL AA.HH. TUPAC AMARU PASAJE LOS LICENCIADOS EN LA ASOC. LOS LICENCIADOS Y PASAJE AMAUTA S/N-091040 DEL BARRIO LA LIBERTAD, PASAJE CANGALLO DE LA URB. MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. MARISCAL CÁCERES, PASAJE MADRID DEL BARRIO SANTA ANA, PASAJE CRISOSTOMO, PASAJE TOMÁS BELLIDO EN EL AA.HH. TUPAC AMARU, PASAJE LOS LICENCIADOS EN LA ASOC. LOS LICENCIADOS Y PASAJE AMAUTA S/N-091040 DEL BARRIO LA LIBERTAD, PASAJE CANGALLO DE LA URB. MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		Municipalidad Huamanga	179539	193.03%	3,111,963	1,061,999
2425718	SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL SECTOR CHILCAL DISTRITO DE OYOTUN PROVINCIA DE CHILCAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	REHABILITACI,N DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL, SECTOR CHILCAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHILCAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		Programa Subsectorial de Irrigacion - Psi	546165	74.34%	1,794,191	1,029,142
2259182	componente investigación- arqueológica- conservación y restauración- difusión- sensibilización y fortalecimiento cultural del pip recuperación de huaca los gavilanes- cementerio gavilanes, huaca las abejas y huaca facho del distrito de tucume- provincia de lambayeque- departamiento de lambayeque- etapa 2018	RECUPERACION DE HUACA LOS GAVILANES,CEMENTERIO LOS GAVILANES,HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL SECTOR SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME DISTRITO DE TUCUME,PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		Mc- Naylamp - Lambayeque	94503	729.85%	8,298,542	1,000,000
2503759	REPARACION DE CALZADA- EN EL(LA) AV PACHECO TRAMO: JR. LEONCIO PRADO - JR. ZAPATEL - DISTRITO DE TARMA- PROVINCIA TARMA- DEPARTAMENTO JUNIN	REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) AV PACHECO TRAMO: JR. LEONCIO PRADO - JR. ZAPATEL - DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN		GORE Junin	135561	71.74%	1,680,258	978,362
2161906	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE CERCADO AREQUIPA DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE CERCADO AREQUIPA	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA.		Sedapar S.A.	66136	651.43%	7,261,377	966,335
2248833	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN I ETAPA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN		Municipalidad Provincial de Satipo	155124	508.46%	5,245,188	862,049
2161906	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE YANAHUARA AREQUIPA	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA.		Sedapar S.A.	66139	778.68%	7,261,377	826,393
2301830	PROGRAMA 005 SECTORIZACION Y CONTROL DE PRESIONES DE LOS CIRCUITOS R-22- R-23- R-23A- R-24 Y N-24 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA -SEDAPAR S.A.		Sedapar S.A.	177874	6138.24%	50,015,072	801,749
2525493	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI BOCA RIO KINKORI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN II ETAPA	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL, TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI - BOCA RIO KINKORI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN		Municipalidad Provincial de Satipo	174329	61.55%	1,223,749	757,485
2178377	SALDO DE CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO- DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH	CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH		Municipalidad Distrital de San Marcos	49129	2388.16%	18,587,792	747,050
2555200	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA IGLESIA SAPAME TORROMOTAL COMPUERTA MARCELO CHIRIMOYO ALTO Y CHIRIMOYO BAJO DEL DISTRITO DE ILLIMO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA IGLESIA, SAPAME, TORROMOTAL, COMPUERTA MARCELO, COLOCHE, CHIRIMOYO ALTO Y CHIRIMOYO BAJO DEL DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		Municipalidad Distrital de Illimo	171952	53.20%	994,627	649,244

CUI	Nombre de obra	Descripción de la inversión		Entidad ejecutora	Código INFOBRAS	Diff (%)	Costo actualizado	Monto de expediente técnico
2195741	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO GAROU (PROGRESIVA 0+000 AL 436.41 Y 0+000 AL 0-417.42) EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNIN - IV ETAPA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO GAROU (PROGRESIVA 0+000 AL 436.41 Y 0+000 AL 0-417.42) EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNIN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO GAROU (PROGRESIVA 0+000 AL 436.41 Y 0+000 AL 0-417.42) EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNIN	Municipalidad Provincial Chanchamayo	111002	200.42%	1,895,990	631,072
2523986	CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NI OS Y NI AS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NI OS Y NI AS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NI OS Y NI AS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Municipalidad Distrital de Saylla	511723	30.28%	812,082	623,323
2569542	CREACION DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO PAUCAYOCC Y HURPAYHUACCA DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	CREACION DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO PAUCAYOCC Y HURPAYHUACCA DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	CREACION DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO PAUCAYOCC Y HURPAYHUACCA DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	Municipalidad Provincial Cangallo	519920	0.00%	616,936	616,936
2161906	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA	Sedapar S.A.	66140	1249.72%	7,261,377	537,990
2248833	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO DE PANGOA SATIPO JUNIN II ETAPA	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO DE PANGOA SATIPO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	Municipalidad Provincial de Satipo	169589	926.29%	5,245,188	511,081
2402491	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA COMUNIDAD DE ATOCOMARCA- DISTRITO DE HUACHOCOLPA- HUANCAREVELICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA COMUNIDAD DE ATOCOMARCA- DISTRITO DE HUACHOCOLPA- HUANCAREVELICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE FIBRA DE ALPACA EN EL CENTRO POBLADO DE ATOCOMARCA - DISTRITO DE HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE HUANCAREVELICA - REGION HUANCAREVELICA	Municipalidad Distrital Huachocolpa	94562	0.00%	398,193	398,193
2398901	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR DE CAYARANI- HUMACHULCO Y ARCATA CENTRO POBLADO DE ARCATA - DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR DE CAYARANI- HUMACHULCO Y ARCATA CENTRO POBLADO DE ARCATA - DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR DE CAYARANI, HUMACHULCO Y ARCATA CENTRO POBLADO DE ARCATA - DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA	Municipalidad Distrital de Cayarani	93412	0.00%	370,132	370,132
2465887	REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE TICLLAS VILLA SANTA ROSA DE CHULLUMPAMPA BUENOS AIRES DE COCHAPAMPA SAN MARTIN DE ATAMPARO SAN BARTOLOME DE INCAPAMPA Y SAN JUAN DE ORCOCOHUASI DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS PROVINCIA DE HUAMANGA REGION AYACUCHO	REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE TICLLAS VILLA SANTA ROSA DE CHULLUMPAMPA BUENOS AIRES DE COCHAPAMPA SAN MARTIN DE ATAMPARO SAN BARTOLOME DE INCAPAMPA Y SAN JUAN DE ORCOCOHUASI DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS PROVINCIA DE HUAMANGA REGION AYACUCHO	REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO B¿SICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE TICLLAS, VILLA SANTA ROSA DE CHULLUMPAMPA, BUENOS AIRES DE COCHAPAMPA, SAN MARTIN DE ATAMPARO, SAN BARTOLOME DE INCAPAMPA Y SAN JUAN DE ORCOCOHUASI, DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO.	Municipalidad Distrital de San Jose de Ticllas	144078	88.56%	696,061	369,146
2378597	REHABILITACION DE LA CALLE BOLIVAR DESDE LA CALLE MANUEL PARDO HASTA LA CALLE PEDRO RUIZ DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	REHABILITACION DE LA CALLE BOLIVAR DESDE LA CALLE MANUEL PARDO HASTA LA CALLE PEDRO RUIZ DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	REHABILITACION DE LA CALLE BOLIVAR DESDE LA CALLE MANUEL PARDO HASTA LA CALLE PEDRO RUIZ, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Municipalidad Provincial Chiclayo	87231	457.88%	1,997,642	358,076
2235392	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO III ETAPA	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO III ETAPA	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	Municipalidad Distrital de Socos	92641	2748.83%	9,442,674	331,458
2235392	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO ETAPA II	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO ETAPA II	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO	Municipalidad Distrital de Socos	72107	3793.89%	9,442,674	242,500
2246729	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULLEN TRAMO ENTRE AVENIDA PIURA Y LA AVENIDA CAJAMARCA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULLEN TRAMO ENTRE AVENIDA PIURA Y LA AVENIDA CAJAMARCA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULLEN (EL CERRO) TRAMO ENTRE LA CALLE PIURA Y AV. 9 DE OCTUBRE - DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	Municipalidad Provincial Chiclayo	91071	819.47%	2,080,342	226,254
2402041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N 7 DE LOS BA OS DEL INCA DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA REGION CAJAMARCA / OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SALDO DE OBRA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N 7 DE LOS BA OS DEL INCA DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA REGION CAJAMARCA / OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SALDO DE OBRA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N° 7 DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA	Municipalidad Distrital de los Baños del Inca	170114	211.75%	515,984	165,512
2402041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N 7 DE LOS BA OS DEL INCA DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA PROVINCIA DE CAJAMARCA REGION CAJAMARCA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N 7 DE LOS BA OS DEL INCA DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA PROVINCIA DE CAJAMARCA REGION CAJAMARCA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N° 7 DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA	Municipalidad Distrital de los Baños del Inca	83771	260.07%	515,984	143,301
2433805	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°925 NIÑO JESUS (CL 609917) REGION PIURA PROVINCIA DE MORROPON - DISTRITO DE LA MATANZA - CP DE NUEVO PORVENIR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°925 NIÑO JESUS (CL 609917) REGION PIURA PROVINCIA DE MORROPON - DISTRITO DE LA MATANZA - CP DE NUEVO PORVENIR	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 609917	M.E.-Programa Nacional Infraestructura Educativa	145784	333.09%	545,766	126,015
2434009	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°1286- CL 765093- REGION PIURA PROVINCIA DE AYABACA - DISTRITO DE FRIAS- CP DE NUEVO AMANEGER	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°1286- CL 765093- REGION PIURA PROVINCIA DE AYABACA - DISTRITO DE FRIAS- CP DE NUEVO AMANEGER	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 765093	M.E.-Programa Nacional Infraestructura Educativa	145786	678.15%	796,312	102,334

CUI	Nombre de obra	Descripción de la inversión		Entidad ejecutora	Código INFOBRAS	Diff (%)	Costo actualizado	Monto de expediente técnico
2283964	OBRA N 06 PUENTE FREYRE 06 PUENTES	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	PROVIAS Nacional	42076			172,431,088	
2379361	CREACION DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH ANTONIO GRA A ELIZALDE DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL ¿ LIMA¿ META I DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA	CREACION DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH ANTONIO GRA A ELIZALDE DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL ¿ LIMA¿ META I DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA	Municipalidad Provincial de Huaral	85566			1,709,952	
2234385	Emersion y Lanzamiento del emisor submatino del proyecto Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Atico provincia de Caraveli region Arequipa	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-Fondepes	89100			21,865,898	
2160484	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS EN LA PARCIALIDAD DE ROSARIO Y AMOTIRE DISTRITO DE PISACOMA CHUCUITO PUNO	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS EN LA PARCIALIDAD DE ROSARIO Y AMOTIRE, DISTRITO DE PISACOMA - CHUCUITO - PUNO	Municipalidad Distrital de Pisacoma	93328			771,710	
2432687	REHABILITACION DEL PUENTE SALITRAL Y ACCESOS	PAQUETE 2 : OBRA 2 - REHABILITACIÓN DE PUENTE SALITRAL Y ACCESOS	PROVIAS Descentralizado	101752			55,456,044	
2443279	REHABILITACION DE PUENTE MELLIZO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA	REHABILITACIÓN DE PUENTE MELLIZO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9¿ LA LIBERTAD 2 / LIMA)	PROVIAS Descentralizado	106669			9,842,238	
2443282	REHABILITACION DE PUENTE QUISHPE Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA	REHABILITACIÓN DE PUENTE QUISHPE Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9¿ LA LIBERTAD 2 / LIMA)	PROVIAS Descentralizado	106672			10,487,746	
2054767	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR HIPOLITO UNANUE TRAMO AV PASEO DE LA REPUBLICA AV SAN PABLO	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. SAN PABLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA	Municipalidad Distrital de la Victoria	115792			12,535,488	
2096111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA DISTRITO HUANTA AYACUCHO SALDO DE OBRA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA , DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO	Municipalidad Distrital de Llochegua	120696			27,042,170	
2323261	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE SISTEMA PRESURIZADO POR GOTEJO EN EL ANEXO SAN JUAN SAN JUNE DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE SISTEMA PRESURIZADO POR GOTEJO EN EL ANEXO SAN JUAN SAN JUNE ¿, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Municipalidad Distrital de Torata	129470			17,141,914	
2491627	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	Municipalidad Distrital de Acos Vinchos	131945			700,247	
2523986	CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NI OS Y NI AS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO	CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Municipalidad Distrital de Saylla	162267			812,082	
							11,257,857,392	5,678,092,555

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.

3. Anexo C: Obras excluidas del informe

Se presenta la relación de obras excluidas del universo de candidatas debido a inconsistencias identificados durante el proceso de depuración y validación de registros administrativos. Estas observaciones presentaban valores atípicos o discrepancias en variables relevantes para la identificación de obras paralizadas, lo que podía distorsionar los criterios de clasificación y el análisis posterior.

Cuadro 15: Listado de obras excluidas por inconsistencias

Nombre de la obra	Codigo Infobras	Costo actualizado (millones S/)	Monto exp. técnico (millones S/)	Nivel de gobierno
Mejoramiento IE Nro 70710 Carique - Kelluyo, Puno	89166	833.89	0.89	Gobierno Local
Electrificación rural - Provincias de Ayacucho y Angaraes	91929	33.60	1.76	Gobierno Nacional
Reparación de pavimento urbano - Chiclayo	129226	5.41	0.57	Gobierno Local
IE Nuestra Señora del Pilar - Patio techado y paneles solares	160096	3.17	0.30	Gobierno Local
Total: 4 obras		876.07	3.52	

Nota: Se excluyen obras por errores de digitación u otras inconsistencias. El saldo de inversión es la diferencia entre el costo actualizado y el devengado acumulado. Cifras en soles (S/).

Fuente: INFOBRAS - Contraloría General de la República; Banco de Inversiones MEF.
